管理番号

GA1299

動作確認チェックシート

検査日	2022年 5月18日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	イオンゲージ(電離真空計)	電源	AC100V		
型式	MIG-831	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アネルバ	寸法(W×D×H)	210×360×100		
機械Ser,No	PP925223	測定圧力範囲	10^{0}～10^{-6}Pa		
製造年月	―	質量	4.7kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【　検査環境　】

＊　社内用排気セット　：　RP + TMP

＊　社内用測定器機　:電離真空計アネルバ:M-430HG　／　測定子アネルバ　MG-2(ミニチュアゲージ)

＊　GA1299 アネルバ電離真空計 MIG-831　／　測定子 アネルバ MG-2 (ミニチュアゲージ:社内用)

① MIG-831:1.9×10-3Pa
(H61130)

②M-430HG:1.17×10-3Pa

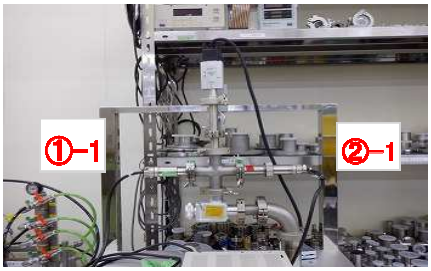

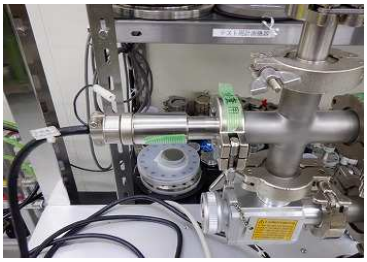

①-1・測定ゲージ:アネルバMG-2
(社内用)

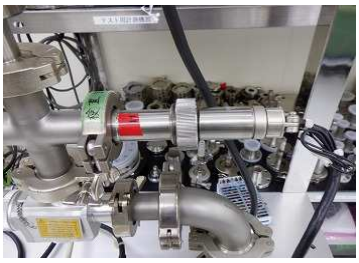

②-1・測定ゲージ:アネルバMG-2
(社内用)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)　　作業工数[2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野

ASK INDEX
