管理番号

J70543

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月15日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	水冷
型式	MU100XN-2	周波数	50 ・ 60 Hz	電流値	11.6A
メーカー名	樫山工業	吸気口径	NW50	排気速度	1660L/min
機械Ser,No	10YDN40849	排気口径	NW25	モーター出力	2.2KW
製造年月	2010年	規格値（到達圧力）	1.5Pa	重量	60Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	性能確認	到達圧力の確認はしたか。	※1　○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

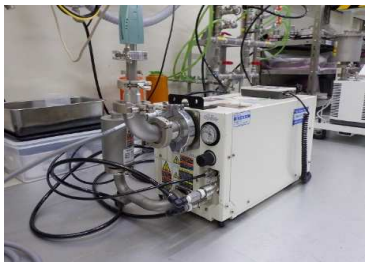

・排気用サイレンサーは
検査用の為、付属致しません。

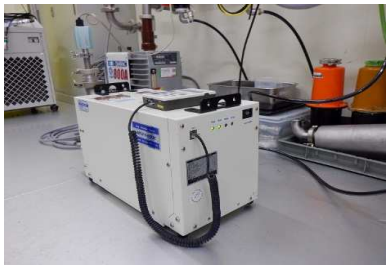

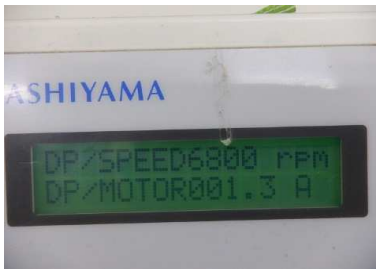

電流値：1.3A

※1　到達圧力：3.8Pa

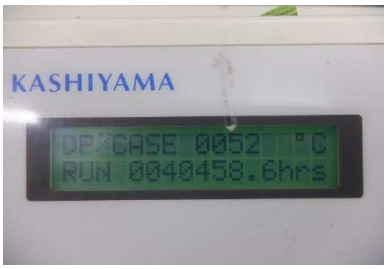

積算時間：40458.6Hr

ポンプ温度：52℃

＊暖気運転60分後、再起動時の測定圧力です。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　[責任者]

動作（ OK ）　　作業時間［ 2.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日
