管理番号

L70613

動作確認チェックシート

検査日	2021年 9月 10日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源・電圧	単相　100V	電流値	5.6/5.0A
型式	DA-60S	周波数	50 ・ 60 Hz	重量	11Kg
メーカー名	アルバック	吸排気口径	O.DΦ9×I.DΦ5	外寸（mm）	212×278×225
機械Ser,No	071429T	使用周囲温度範囲	7～40℃		
製造年月	ー	規格値（到達圧力）	6.7×103Pa　(-94.6kPa)		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1　○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

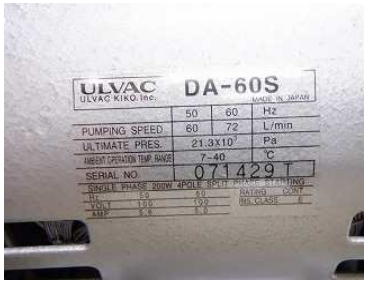

※1　到達圧力 ： −71.5KPa　　電流値：3.9A

＊暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。（ 測定圧力は規格値の76%です。）

取扱説明書（　無　）＊規格値内にてご使用の際はオーバーホールが必要です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRA SAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作(OK)　　作業工数[　2.0H　]　　＊標準オーバーホール参考費用 ： 45,000円

検査担当者[　　立野　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野

ASK INDEX
