管理番号

N31347

動作確認チェックシート

検査日	2024年　10月　7日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	チラー（水冷）	電源電圧	三相200，220V	冷却方式	水冷
型式	RKE2200B1-VM-G1	周波数	50/60Hz	冷媒	R-401A
メーカー名	オリオン機械	温度範囲	＋5℃～＋35℃		
機械Ser,No	608014	外寸	530×970×1080		
製造年月	2018	重量	135kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等） 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

１、外観確認を実施。　→　液面計が汚れており水位が確認出来ないため、清掃を実施。
２、動作確認　OK　設定温度を5℃とし、水槽内水温をデータロガで確認した。（数値は参考値です）
温調水は本体内ポンプで循環させて水温確認。
起動後約7min30secで23.9℃⇒4.7℃に到達。（本体表示値）

動作確認

液面計の汚れ清掃実施

設定下限値５.０℃に設定

起動後約7min30secで２３.9℃ ⇒ ４.7℃に到達

動作時 各メーター表示値

データロガ波形

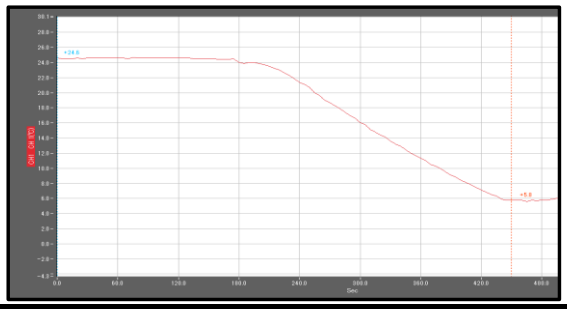

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］
動作（ OK ）　　作業工数［ 2.5 H ］
検査担当者 ［　佐藤（紀）　］　　中野
ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日
