管理番号

N70548

動作確認チェックシート

検査日	2023年 8月24日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	蒸着装置	電源	AC100/200v
型式	VPC-1100	ワークサイズ	サブストレートプレート径　φ340
メーカー	アルバック機工	設置サイズ	1145x913x2155　335Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源投入、約2hで到達圧力 5x10-4Pa以下確認。ロータリー/クライオポンプ動作問題なし。

蒸着電源、ボード切替、電力コントロール問題なし。

膜厚コントローラー、モニターのみ、電力コントロールは未使用。

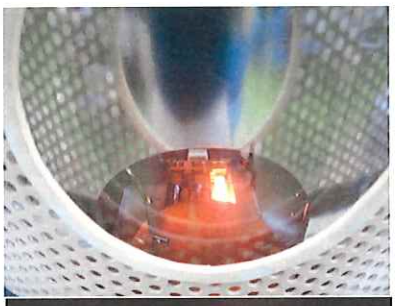

操作説明書（有り）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[30H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日
