管理番号

N80386

再動作確認チェックシート

検査日	2024年4月24日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相　200-220V	冷却法	水冷
型式	SDE90	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	1300L/min
メーカー名	樫山工業	吸気口径	NW40	モーター出力	4.0KW
機械Ser,No	02K1333	排気口径	NW40	重量	150Kg
製造年月	－	規格値（到達圧力）	1.3Pa	外寸	380×700×550

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

＊　暖気運転1時間後、再起動時の測定圧力です。【 到達圧力：6.4×10^{-1}Pa 】

＊ハンドヘルドコントローラーは付属致しません。

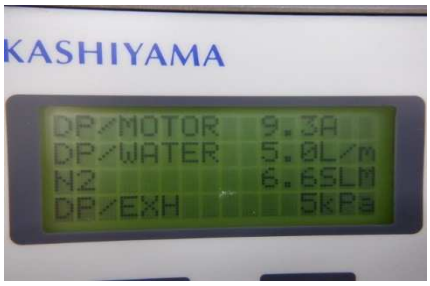

電流値：9.3A

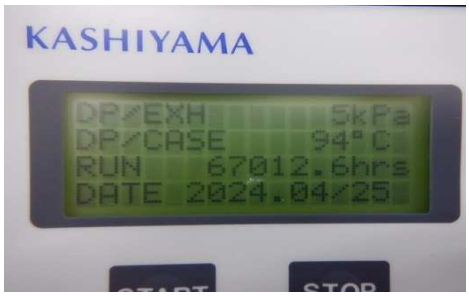

CASE温度：94℃

取扱説明書（ 無 ）

積算時間：67012.6hrs

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業時間［ 3.0H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日
