管理番号

NA0076

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月6日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	チラー	電源電圧	AC100V	水槽	約5L（液量約4.2L）
型式	SOC-700	周波数	（50 / 60）Hz		
メーカー名	アズワン	温度設定範囲	-15～+30℃		
機械Ser,No	1912-1312-6033	最大流量	約12L/min		
製造年月		揚程	約8m		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1)IN,OUT連結、水温17℃、設定温度-15℃、起動、10分経っても冷却しない、コンプレッサー稼働。

IN,OUT連結

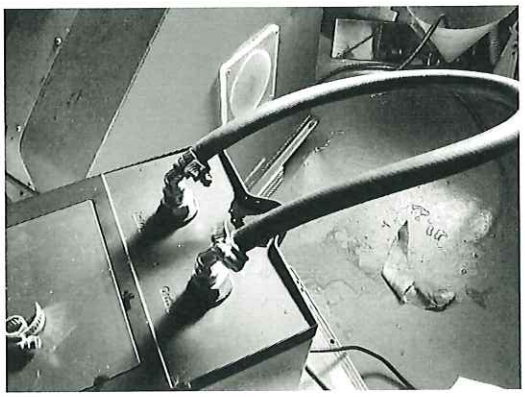

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（NG）　作業工数[2 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日
