管理番号

NC0508

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月27日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	三相　200V	冷却方法	水冷
型式	MU600X-020	周波数	50/60 Hz	積算時間	68197.6 h
メーカー名	樫山工業	吸気フランジ	NW80	DPモーター出力	2.5 kw
機械Ser,No	115DN46710	排気フランジ	NW40	排気速度	10000 L/min
製造年月	2011年	規格値（到達圧力）	0.5 Pa	重量	120 kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1 ○

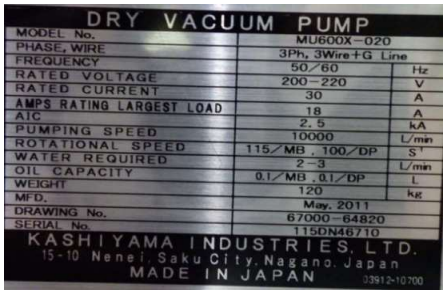

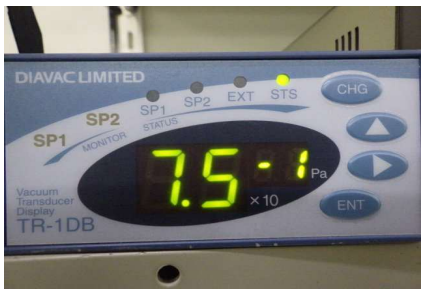

※1到達圧力：0.75 Pa

暖気運転1時間30分データ

DPモーター電流値：1.4A

MBモーター電流値：0.7A

DPケーシング温度：58℃

積算時間：68197.6 h

取扱説明書（　無　）　＊暖気運転1時間30分後、再起動時の到達圧力です。　特に異常有りませんでした。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（ 備考欄コメント ）　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　作業時間［ 3.5H ］

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

穂苅
