管理番号

NC1067

動作確認チェックシート

検査日	2024年5月24日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	三相　200V	冷却法	水冷
型式	ESA200W	周波数	50・ 60 Hz	定格電流	34.2 A
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW 80	排気速度	20000L/min
機械Ser,No	DHF00287	排気フランジ	NW 40	重量	410 kg
製造年月	2017年	規格値（到達圧力）	0.5 Pa	積算時間	30790 h

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

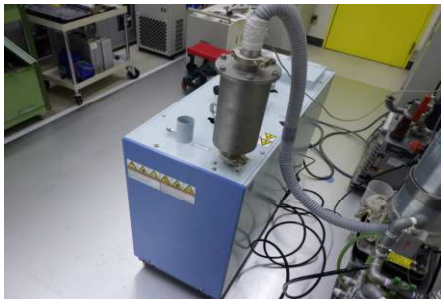

到達圧力 :0.16 Pa　　BP・MP電流値:3.9 A　9.9 A　　運転時MPケーシング温度:117℃

取扱説明書（　無　）　＊暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（ 備考欄コメント ）　　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　作業時間［ 3.0H ］　　到達圧力は規格値を満たしております。

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

堀内（一）

ASK INDEX
