管理番号

NC1167

動作確認チェックシート

検査日	2024年6月10日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	1P 100/ 200V	冷却法	空冷
型式	2012A	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	208・250L/min
メーカー名	アルカテル	吸気フランジ	NW25	モーター出力	0.55KW
機械Ser,No	225654	排気フランジ	NW25	電流値	8.0/4.0A
製造年月	―	規格値（到達圧力）	2×10^{-1}Pa	重量	27Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

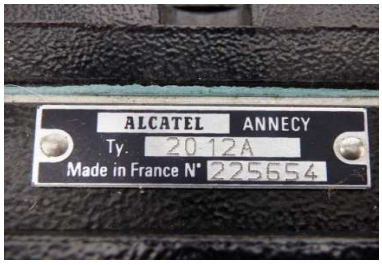

＊オイルミストトラップは動作確認用の為、付属致しません。

※1 到達圧力：7.7×10^{-1}Pa

電流値：4.09A

＊暖気運転1時間後、再起動時の測定圧力です。　（規格値にて、ご使用の際はオーバーホールが必要です。）

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業時間［ 2.0H ］

検査担当［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

堀内（一）

ASK INDEX
